	Cód. ANTT: RSP-116SP-205+008-PAS-ASB-RF-Z9-1-R01

Emitente: CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO – SÃO PAULO S.A	Data de Emissão Inicial: 25/04/2025
---	---

Rodovia: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA – BR 116	Projetista:
--	-------------

Trecho: km 205+008 – Região Metropolitana de São Paulo
--

Objeto: Relatório de Entrega de Obra – Passarela P01 km 205+008

Documentos de Referência: <ul style="list-style-type: none"> • RS-ADC-1293/2025 (SEI 33759108)
--

Documentos Resultantes:

Observações:

1	Certificado	16/10/2025	Emissão Certifi			
0	As Built	25/04/2025	Emissão Inicial			
Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP	ANTT

RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

Implantação da Passarela P01 Pedágio

km 205+008

Município de Guarulhos, BR-116/SP

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. – “CCR RioSP”.
- **Rodovia:** BR-101/BR-116
- **Trecho:** Rio de Janeiro / São Paulo
- **Extensão:** 625,8 km

Santa Isabel/SP

Outubro de 2025

Sumário

1.	Apresentação do Relatório.....	4
2.	Informações da Concessão.....	5
3.	Mapa do Sistema Rodoviário.....	5
4.	Informações PER e Localização da Obra.....	6
5.	Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra	6
6.	Memorial Descritivo	7
7.	Cronograma da Obra	8
8.	Registro Fotográfico	9
9.	Certificado de Inspeção	14
10.	Conclusão	15

1. Apresentação do Relatório

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de **Implantação da Passarela P01 Pedágio km 205+008, no município de Guarulhos na rodovia BR-116/SP**, concluída efetivamente em fevereiro/2025, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50505.069924/2024-01, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para o 3º ano da Concessão (28/02/2025).

Processo: 50505.069924/2024-01

PER: Item 3.2.1.2.P

Prazo de Conclusão: 3º ano de concessão (28/02/2025),

Descrição da Obra: Adequação de Passarela

Localização: km 205+008 da BR-116/SP, município de Guarulhos/SP.

4. Informações PER e Localização da Obra

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.2.1.2P	BR-116	SP	205,008	23° 24' 54,5" S	46° 22' 4,63 O	PNS	2025	2025

Figura 3 – Informações PER



Figura 4 – Localização da obra

5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Aprovação do Anteprojeto		Autorização de Início	
	Parecer	SEI	Documento	SEI
50505.069924/2024-01	27365/2024/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR-ANTT	25723071	316/2024	26724820

Figura 5 – principais documentos do processo

6. Memorial Descritivo

A Passarela P01 Pedágio constitui dos elementos descritos abaixo:

- Fundação em 58 estacas pré-moldadas com comprimento médio de 11m e blocos de concreto armado.
- 11 Pilares pré-moldados em concreto armado com comprimento de até 9m, vigas de rampa em duplo T protendida.
- Guarda-corpo metálico, fabricado com barras chatas e tubos metálicos com 707,60m
- Telamento metálico galvanizado, instalado no vão central das vigas de travessias com extensão de cerca de 86,00m com aplicação de pintura
- Instalação de piso tátil e braile nas saídas das rampas
- Instalação de trava motos nas saídas das rampas;

7. Cronograma da Obra

Abaixo, cronograma de execução da passarela P01, no município de Guarulhos, BR-116/SP, evidenciando conclusão em fevereiro/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	SENTIDO	STATUS	Acum até Final Ano 2	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	Ano 3 até fev/25	Acum até fev/25
	BR-116/SP - RMSP - LOTE 3		PLANEJADO										10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%	100,00%
3.2.1.2.P	Passarelas (BR-116/SP)	P01 Pedágio	CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,21%	36,34%	24,25%	15,94%	5,26%	100,00%	100,00%
	SERVIÇOS PRELIMINARES		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,21%	1,86%	11,10%	0,24%	0,59%	100,00%	100,00%
	DEMOLIÇÕES/ADEQUAÇÕES		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,38%	80,62%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	INFRA-ESTRUTURA		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,31%	26,89%	67,51%	3,29%	0,00%	100,00%	100,00%
	MESO-ESTRUTURA		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,54%	8,96%	68,65%	13,85%	0,00%	100,00%	100,00%
	SUPERESTRUTURA		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,68%	44,13%	14,17%	23,02%	0,00%	100,00%	100,00%
	ACABAMENTOS		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%	100,00%
	ILUMINAÇÃO		CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

8. Registro Fotográfico



Rampa Sul



Rampa Norte




Travessia



Sinalização Horizontal



Sinalização Vertical

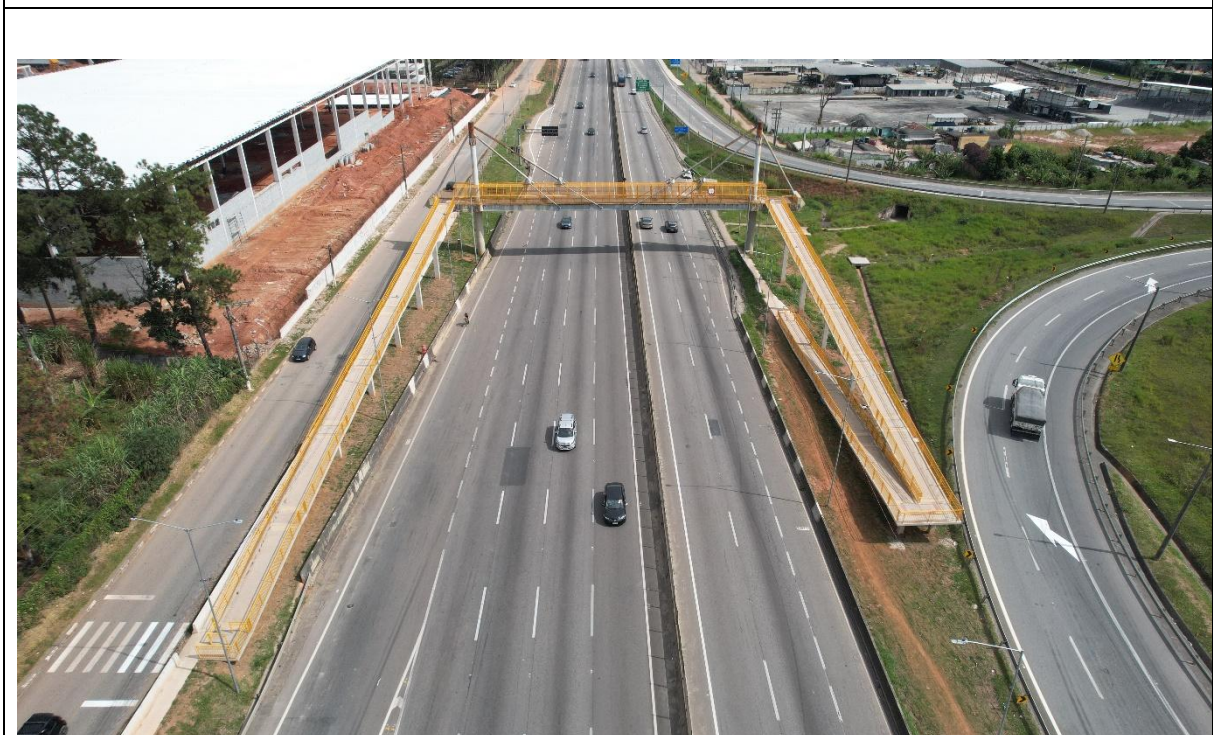

Iluminação



Acessibilidade - Braile



Acessibilidade - Podotátil



Trava Motos

9. Certificado de Inspeção



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO

Nº CI.2025.009



Solicitante: CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SÃO PAULO S.A

CNPJ: 44.319.688/0001-42

Endereço: Rodovia Presidente Dutra - Morro Grande - Santa Isabel - SP - 07500-000

Contrato de concessão: 03/2021

Contrato de inspeção: 4600066603

Obra de Infraestrutura: Execução dos serviços de Inspeção Acreditada de Obras de Rodovias da P01 - Adequação da Passarela Pedágio, localizada no km 205+008 da BR-116/SP.

A PA INSPEÇÕES OIA-0010 declara que a inspeção esta em conformidade com os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012 e Portaria nº 367 de 20/12/2017, para os projetos nas disciplinas abaixo relacionadas. A inspeção foi elaborada em conformidade as normas vigentes que estão relacionadas nos relatórios de inspeção especificas para cada disciplina avaliada.

Relação das disciplinas avaliadas

ITEM	DESCRIÇÃO	DATA DE APROVAÇÃO
1	Execução de Obras - Mobilização	06/12/2024
2	Execução de Obras - Estaca Cravadas	06/12/2024
3	Execução de Obras - Armação blocos de fundação	06/12/2024
4	Execução de Obras - Forma e Concretagem dos blocos	06/12/2024
5	Execução de Obras - Estruturas Pré-moldadas de concreto Pilares	06/12/2024
6	Execução de Obras - Estruturas Pré-moldadas de concreto Horizontais e inclinados	14/12/2024
7	Execução de Obras - Estruturas Metálicas	14/03/2025
8	Execução de Obras - Sinalização e Dispositivos de Segurança	14/03/2025
9	Execução de Obras - Iluminação e Instalações Eletricas	14/03/2025
10	Execução de Obras - Inspeção final de obra	14/03/2025

Este relatório esta vinculado aos seguintes documentos:

- Plano de Inspeção - PI-17.22.62-1;
- Relatório Final de Inspeção RI-17.22.62-0;
- Declaração de Imparcialidade e Veracidade DI-17.22.62-1.

Este projeto está vinculado ao processo administrativo do projeto funcional/anteprojeto nº 50505.069924/2024-01

Exclusões:

- Para a execução desta obra não foi aplicável adições ou exclusões.

Declaramos que os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao serviço realizado e aos itens inspecionados.

Declaramos que esse Certificado de Inspeção não pode ser reproduzido sem autorização formal da P A Inspeções, com exceção do Poder Concedente e caso aprovado, seja feito sempre por completo teor.

Para verificação do status desse certificado entrar em contato com a PA INSPEÇÕES

Revisão e data de emissão: Rev00: 29 de setembro de 2025

Assinado por:



Vitor Daniel Berno
CREA 601780190

Responsável Técnico - CREA 601780190

Assinado por:



Perciles Arinho
CREA 254708170004602

Diretor Geral - PA Inspeções



link para verificação de veracidade do certificado:

P A INSPEÇÕES - AL Lorena, 131 - conj. 132 - 01424-001 - São Paulo - SP - Brasil - Fone: +55 11 94308-8882 - www.painspecoes.com.br - CNPJ: 20.460.674/0001-86

10. Conclusão

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.2.1.2 Obras de melhorias”, alínea “P. Passarelas (BR-116)” Passarela P01 Pedágio, km 205+008, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civis, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão Nº 003/2021.
