	Cód. ANTT: <b>RSP-116SP-319+600-PPD-ASB-RF-Z9-001-R00</b>

Emitente: <b>CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO RIO – SÃO PAULO S.A</b>	Data de Emissão Inicial: <b>23/01/2026</b>
---	---

Rodovia: <b>RODOVIA PRESIDENTE DUTRA – BR 116</b>	Projetista:
--	-------------

Trecho: <b>km 319+600 – Edificações</b>
--

Objeto: <b>Relatório de Entrega de Obra – PPD-319 Itatiaia km 319+600</b>
--

Documentos de Referência: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta RS-ADC-0604/2025 (SEI 31001946)</li> </ul>
--

Documentos Resultantes:
-------------------------

Observações:
--------------

Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP	ANTT
1	Certificado	23/01/2026	Emissão Certif			
0	As Built	28/02/2025	Emissão Inicial			

# RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

**Implantação do PPD-319 Itatiaia km 319+600**  
**Município de Itatiaia, BR-116/RJ**

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. – “CCR RioSP”.
- **Rodovia:** BR-101/BR-116
- **Trecho:** Rio de Janeiro / São Paulo
- **Extensão:** 625,8 km

**Santa Isabel/SP**

Janeiro de 2026

## Sumário

1.	Apresentação do Relatório.....	4
2.	Informações da Concessão.....	5
3.	Mapa do Sistema Rodoviário.....	6
4.	Informações PER e Localização da Obra.....	6
5.	Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra.....	7
6.	Memorial Descritivo.....	8
7.	Cronograma da Obra.....	9
8.	Registro Fotográfico.....	10
9.	Certificado de Inspeção.....	12
10.	Conclusão.....	13

## **1. Apresentação do Relatório**

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de **Implantação de PPD-319 de Itatiaia no km 319+600 Norte, no município de Itatiaia da rodovia BR-116/RJ**, concluída efetivamente em fevereiro/2025, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50500.111459/2023-70, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para o 2º ano da Concessão (28/02/2024).

**Processo:** 50500.111459/2023-70

**PER:** Item 3.4.4.5

**Prazo de Conclusão:** 2º ano de concessão (28/02/2024)

**Descrição da Obra:** Implantação de Ponto de Parada e Descanso

**Localização:** km 319+600 da BR-116/RJ, município de Itatiaia/RJ

## 2. Informações da Concessão


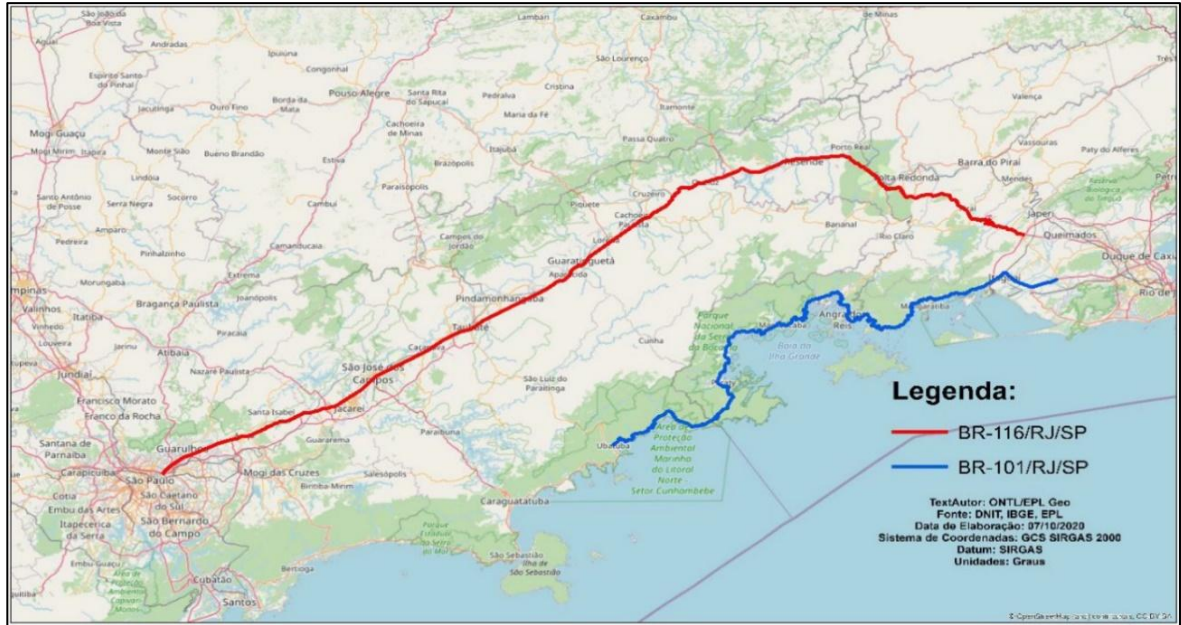
 <b>DADOS CONTRATUAIS</b>	
<b>Concessionária</b>	Concessionária do Sistema Rodoviário Rio – São Paulo S.A. – “CCR RioSP”
<b>Contrato</b>	Edital nº 03/2021
<b>Escopo do Contrato</b>	Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
<b>Assinatura do Contrato</b>	28/01/2022
<b>Início da Concessão</b>	01/03/2022
<b>Rodovia</b>	BR-101/116
<b>Trecho</b>	São Paulo / Rio de Janeiro
<b>Extensão (km)</b>	625,8 km
<b>Prazo</b>	30 anos

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão



**Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão**

**4. Informações PER e Localização da Obra**

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.4.4.5	BR-116	RJ	319,600	22°28'34.37"S	44°31'21.07"O	PN	2024	2025

**Figura 3 – Informações PER**



**Figura 4 – Localização da obra**

## 5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Aprovação do Anteprojeto		Autorização de Início	
	Parecer	SEI	Documento	SEI
50500.111459/2023-70	36779/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	20140540	146/2023	20880976

**Figura 5 – principais documentos do processo**

## 6. Memorial Descritivo

O PPD-319 Itatiaia, implantado no km 319+600 Norte constitui dos elementos descritos abaixo:

- Pátio de caminhoneiros e quatro edificações: uma guarita de controle dos acessos de entrada e saída, a edificação principal de apoio ao caminhoneiro, outra edificação para conveniados e uma última para a subestação de energia;
- Edifício principal conta com 613 m<sup>2</sup> de área construída, local de refeições para 90 pessoas, lavanderia com 10 tanques e bancadas de apoio, 11 sanitários, vestiários, 01 sala de descanso para caminhoneiros, fraldário e 02 lojas de conveniência com área igual a 58 m<sup>2</sup> cada;
- Pátio cercado em pavimento rígido com o controle de acesso e vigilância; e calçamento em piso de concreto intertravado. Com capacidade para 120 vagas para veículos de carga de 7 a 9 eixos, sendo 2 vagas com tomadas para veículos refrigerados, e vagas para 20 veículos leves;
- Edifício de conveniados conta com galpão de serviços de interesse do caminhoneiro com área de 620,00 m<sup>2</sup> construída;
- Guarita para controle dos acessos de entrada e saída, com área de 58,00 m<sup>2</sup>;

## 7. Cronograma da Obra

Abaixo, cronograma de execução do ponto de parada e descanso, no município de Itatiaia, BR-116/RJ, evidenciando conclusão em fevereiro/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	KM PROJ INICIAL	KM PROJ FINAL	SENTIDO	ANO PER	PESO	STATUS	Acum até Final Ano 2	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	Ano 3 até fev/25	Acum até fev/25
3.4.4.5	Implantação de PPD (BR-116/RJ)	319+600	319+600	Norte	2º	25,00%	CONCLUÍDO	27,30%	3,08%	5,65%	4,47%	4,95%	8,49%	8,76%	8,54%	16,85%	10,96%	0,55%	0,15%	0,25%	72,70%	100,00%
	SERVIÇOS PRELIMINARES					18,00%	CONCLUÍDO	85,00%	0,00%	5,00%	6,00%	0,00%	4,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%
	TERRAPLENAGEM					30,00%	CONCLUÍDO	40,00%	9,00%	12,60%	8,00%	11,40%	4,40%	3,40%	4,60%	4,40%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
	EDIFICAÇÕES					7,00%	CONCLUÍDO	0,00%	4,50%	11,00%	12,60%	20,85%	5,80%	9,55%	7,95%	17,55%	9,50%	0,70%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	PÁTIO DE ESTACIONAMENTO					22,00%	CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	16,30%	18,30%	40,85%	19,75%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	ALÇAS DE ACESSO					15,00%	CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	13,00%	17,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	SINALIZAÇÃO / EPS					3,00%	CONCLUÍDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	38,00%	12,00%	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%
	SERV EXTERNOS / ACABAMENTOS					5,00%	CONCLUÍDO	0,00%	1,25%	4,00%	2,25%	1,50%	9,75%	9,75%	12,50%	31,25%	23,00%	2,75%	0,00%	2,00%	100,00%	100,00%

## 8. Registro Fotográfico



Vista aérea



Entrada



**Estacionamento / Conveniados**




**Estacionamento**



**Vista Frontal**

## 9. Certificado de Inspeção

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO		
		
<b>Nº CI.2026.53</b>		
<b>Solicitante:</b> CONCESSIONARIA DO SISTEMA RODOVIARIO RIO - SÃO PAULO S.A		
<b>CNPJ:</b> 44.319.688/0001-42		
<b>Endereço:</b> Rodovia Presidente Dutra - Morro Grande - Santa Isabel - SP - 07500-000		
<b>Contrato de concessão:</b> 03/2021		
<b>Contrato de inspeção:</b> 4600076187		
<b>Obra de Infraestrutura:</b> Execução dos serviços de Inspeção Acreditada de Obras de Rodovias do Ponto de Parada e Descanso (PPD), localizado no km 319+600 - Pista Norte da BR-116/RJ.		
<p>A PA INSPETÇÕES OIA-0010 declara que a inspeção esta em conformidade com os requisitos da ABNT NBR ISO/IEC 17020:2012 e Portaria nº 367 de 20/12/2017, para os projetos nas disciplinas abaixo relacionadas. A inspeção foi elaborada em conformidade as normas vigentes que estão relacionadas nos relatórios de inspeção especificas para cada disciplina avaliada.</p>		
<b>Relação das disciplinas avaliadas</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	DATA DE APROVAÇÃO
1	Execução de Obras - Mobilização	08/03/2024
2	Execução de Obras - Fornecimento e Montagem de Estruturas Metálicas	29/10/2024
3	Execução de Obras - Iluminação e Instalações Eletricas	05/12/2024
4	Execução de Obras - Elementos de acabamento em edificações	05/12/2024
5	Execução de Obras - Iluminação e Instalações Eletricas em Edificações	05/12/2024
6	Execução de Obras - Instalações Tubulares em Edificações	05/12/2024
7	Execução de Obras -Sinalização e Dispositivos de Segurança	05/12/2024
8	Execução de Obras - Infraestrutura - Fundações	12/04/2024
9	Execução de Obras - Estrutura OAE - Blocos; Meso e Supraestrutura	05/12/2024
10	Execução de Obras - Linhas de Drenagem profunda	07/03/2025
11	Execução de Obras - Pavimentação	05/12/2024
12	Execução de Obras - Terraplenagem	20/08/2024
13	Execução de Obras - Dispositivos de drenagem e passeios em concreto	07/03/2025
14	Execução de Obras - Inspeção final de obra	07/03/2025
<p>Este relatório esta vinculado aos seguintes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plano de Inspeção - PI-29.23.10-1;</li> <li>- Relatório Final de Inspeção RI-29.23.10-0;</li> <li>- Declaração de Imparcialidade e Veracidade DI-29.23.10-1.</li> </ul> <p>Este projeto está vinculado ao processo administrativo do projeto funcional/anteprojeto nº 50500.111459/2023-70</p> <p>Exclusões:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para a execução desta obra não foi aplicável adições ou exclusões.</li> </ul> <p>Declaramos que os resultados da inspeção referem-se exclusivamente ao serviço realizado e aos itens inspecionados.</p> <p>Declaramos que esse Certificado de Inspeção não pode ser reproduzido sem autorização formal da P A Inspeções, com exceção do Poder Concedente e caso aprovado, seja feito sempre por completo teor.</p> <p>Para verificação do status desse certificado entrar em contato com a PA INSPETÇÕES</p> <p style="text-align: center;"><b>Revisão e data de emissão: Rev00: 09 de janeiro de 2026</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Assinado por:</p>  <p>F9B86ED81C0842F...</p> <p><b>Vitor Daniel Berno</b></p> <p>Responsável Técnico - CREA 601780190</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Assinado por:</p>  <p>254708170D04462...</p> <p><b>Péricles Arelho</b></p> <p>Diretor Geral - PA Inspeções</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">link para verificação de veracidade do certificado:</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">P A INSPETÇÕES - Al. Lorena, 131 - conj. 132 - 01424-001 - São Paulo - SP - Brasil - Fone: +55 11 94306-9882 - www.painspecoes.com.br - CNPJ: 20.460.674/0001-06</p>		

## **10. Conclusão**

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.4.4.5 Implantação de PPD-319 Itatiaia no km 319+600 ao km 319+600 Norte, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civas, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão Nº 003/2021.
