



Cód. ANTT: VSL-101RS-000+000-OAE-EXE-RT-V1-001-R02

Emitente:

CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO – VIASUL

Data de Emissão
Inicial:

18/05/2025

Rodovia:

RODOVIA BR-101/RS

Projetista:

Trecho:

BR-101 – km 000+000 (PER) – RS-TORRES

Objeto:

Relatório de Entrega de Obra – Ponte sobre o Rio Mampituba OAE BR-101 km 000+000

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observações:

R0A	As Built	25/04/2025	Emissão Inicial			
Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP	ANTT

RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

Recuperação da Ponte sobre o Rio Mampituba

OAE BR-101 km 000+000

Município de TORRES, BR-101/RS

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário
- **Rodovia:** BR-101
- **Trecho:** km 000+000

Porto Alegre/RS

Maio de 2026

Sumário

1. Apresentação do Relatório	4
2. Informações da Concessão	5
3. Mapa do Sistema Rodoviário.....	5
4. Informações PER e Localização da Obra.....	6
5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra	6
6. Memorial Descritivo	7
7. Registro Fotográfico	8
8. Conclusão	10

1. Apresentação do Relatório

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de **Recuperação da Ponte sobre o Rio Mampituba OAE do km 000+000 (PER), no município de TORRES da rodovia BR-101/RS**, concluída efetivamente em maio 2023, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação – processo SEI nº 50500.108542/2021-08, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para fevereiro 2024.

PER: Item 3.2.1.2.

Prazo de Conclusão: fevereiro de 2024.

Descrição da Obra: Recuperação da Ponte sobre o Rio Mampituba.

Localização: Km 000+000 da BR-101/RS, município de TORRES/RS.

2. Informações da Concessão


 DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – “CCR ViaSul”
Contrato	Edital nº 01/2018
Escopo do Contrato	Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, Recuperação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do Contrato	11/01/2019
Início da Concessão	15/02/2019
Rodovia	BR-101/116/386/448
Trecho	Rio Grande do Sul
Extensão (km)	473,4 km
Prazo	30 anos

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão

3. Mapa do Sistema Rodoviário

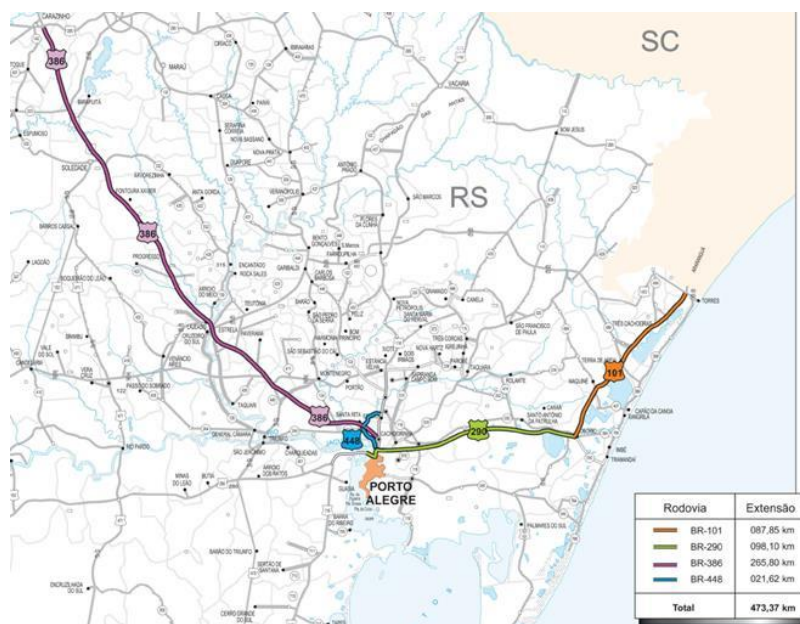


Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão

4. Informações PER e Localização da Obra

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.2.1.2	BR-101	RS	000,000	29°17'57.63"S	49°46'11.49"O	PN	2023	2023

Figura 3 – Informações PER



Figura 4 – Localização da obra

5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Projeto Executivo Apresentado			Encerramento de obra		
	Parecer	SEI	Data	Parecer	SEI	Data
50500.108542/2021-08	5185/2023/CPROJ/G EENG/SUROD/DIR- ANTT	15501149	15/02/2023	8878/2026/RS/ESREGR OD- POA/SUL/COROD/GEF OP/SUROD/DIR-ANTT	40414830	13/03/2026

Figura 5 – principais documentos do processo

6. Memorial Descritivo

A recuperação da Ponte sobre o Rio Mampituba constitui dos elementos descritos abaixo:

- Remoção da Camada Vegetal;
- Corte/Aterro;
- Camadas Finais de Terraplenagem;
- Sub-base;
- Base;
- Revestimentos;
- OAE;
- Sinalização Vertical;
- Sinalização Horizontal;
- Dispositivos de Segurança;
- Paisagismo;
- Limpeza de Canteiro.

7. Registro Fotográfico



Vista lateral do guarda corpo BR 101-km 000+000.



Içamento das vigas BR 101-km 000+000.



Vista recuperação OAE vão 2 BR 101-km 000+000.



Vista aérea da OAE BR 101-km 000+000.

8. Conclusão

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.2.1.2 Obras de melhorias”, alínea “recuperação da OAE(BR-101)” Ponte sobre o Rio Mampituba, km 000+000, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civas, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão N° 001/2018.
