

		Cód. ANTT: VSL-101RS-052+930-OAE-EXE-RT-V1-001-R01				
Emitente: CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO – VIASUL			Data de Emissão Inicial: 18/05/2025			
Rodovia: RODOVIA BR-101/RS			Projetista:			
Trecho: BR-101 – RS-TERRA DE AREIA km 052+930 (PER)						
Objeto: Relatório de Entrega de Obra – OAE – Ponte sobre o Rio Sanga Funda BR-101 km 052+930N (PER)						
Documentos de Referência:						
Documentos Resultantes:						
Observações:						
R0A	As Built	25/04/2025	Emissão Inicial			
Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP ANTT	

RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

**Recuperação da Ponte sobre o Rio Sanga Funda BR-101 km
052+930 (PER)
Município de Terra de Areia, BR-101/RS**

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário
- **Rodovia:** BR-101
- **Trecho:** km 052+930 N (PER)

Porto Alegre/RS

Maio de 2026

Sumário

1.	Apresentação do Relatório.....	4
2.	Informações da Concessão	5
3.	Mapa do Sistema Rodoviário.....	5
4.	Informações PER e Localização da Obra.....	6
5.	Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra	6
6.	Memorial Descritivo	7
7.	Registro Fotográfico	8
8.	Conclusão	11

1. Apresentação do Relatório

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de Recuperação da Ponte sobre o Rio Sanga Funda **do km 052+930, no município de Terra de Areia da rodovia BR-101/RS**, concluída efetivamente em fevereiro/2023, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50500.108529/2021-41, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para fevereiro de 2024.

PER: Item 3.1.3

Prazo de Conclusão: Fevereiro de 2024.

Descrição da Obra: Recuperação da OAE – Ponte sobre o Rio Sanga Funda

Localização: Km 052+930 da BR-101/RS, município de Terra de Areia/RS.

2. Informações da Concessão


 DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – “CCR ViaSul”
Contrato	Edital nº 01/2018
Escopo do Contrato	Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, Recuperação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do Contrato	11/01/2019
Início da Concessão	15/02/2019
Rodovia	BR-101/116/101/448
Trecho	Rio Grande do Sul
Extensão (km)	473,4 km
Prazo	30 anos

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão

3. Mapa do Sistema Rodoviário

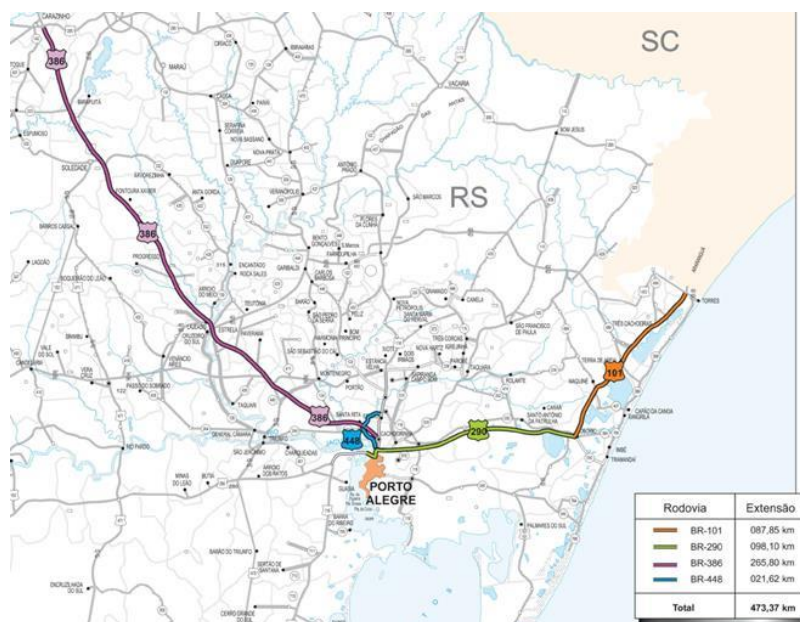


Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão

4. Informações PER e Localização da Obra

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.2.1.2P	BR-101	RS	052,930	29°37'56.21"S	50°06'05.87"O	N	2023	2023

Figura 3 – Informações PER



Figura 4 – Localização da obra

5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Projeto Executivo Apresentado			Encerramento de obra		
	Parecer	SEI	Data	Parecer	SEI	Data
50500.108529/2021-41	5345/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	15514973	16/02/2023	8874/2026/RS/ESREGRO D-POA/SUL/COROD/GEFO P/SUROD/DIR-ANTT	40414266	13/03/2026

Figura 5 – principais documentos do processo

6. Memorial Descritivo

A interconexão do tipo trombeta constitui dos elementos descritos abaixo:

- Remoção da Camada Vegetal;
- Corte/Aterro;
- Camadas Finais de Terraplenagem;
- Sub-base;
- Base;
- Revestimentos;
- OAE;
- Sinalização Vertical;
- Sinalização Horizontal;
- Dispositivos de Segurança;
- Paisagismo;
- Limpeza de Canteiro.

7. Registro Fotográfico



Vista aérea BR101 km 052+930N.



Vista aérea BR101 km 052+930N.



BR 101 km 052+930 N.



BR 101 km 052+930 N.



BR 101 km 052+930 N.



BR 101 km 052+930 N.

8. Conclusão

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.1.3 Obras de arte especiais”, alínea “Recuperação (BR-101)” da Ponte sobre o Rio Sanga Funda, km 52+930 pista Norte, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civis, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão Nº 001/2018.
