	Cód. ANTT: VSL-101RS-019+440-RET-EXE-RT-V1-001-R01

Emitente: <b>CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO – VIASUL</b>	Data de Emissão Inicial: <b>18/05/2025</b>
--	---

Rodovia: <b>RODOVIA BR-101/RS</b>	Projetista:
--------------------------------------	-------------

Trecho: <b>BR 101/RS – RS - TRÊS CACHOEIRAS 019+360 (PER)</b>
--

Objeto: <b>Relatório de Entrega de Obra – Reformulação do Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação) BR-101/RS km 019+360 (PER)</b>
--

Documentos de Referência:
---------------------------

Documentos Resultantes:
-------------------------

Observações:
--------------

R0A	As Built	25/04/2025	Emissão Inicial			
Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP	ANTT

# RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

**Implantação da Reformulação do Retorno em Nível (un)  
(inclusive iluminação)**

**BR-101/RS km 019+360 (PER)**

**Município de Três Cachoeiras, BR-101/RS**

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário
- **Rodovia:** BR-101/RS
- **Trecho:** km 019+360 (PER)

**Porto Alegre/RS**

Maio de 2026

## Sumário

1.	Apresentação do Relatório.....	4
2.	Informações da Concessão.....	5
3.	Mapa do Sistema Rodoviário.....	5
4.	Informações PER e Localização da Obra.....	6
5.	Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra.....	6
6.	Memorial Descritivo.....	7
7.	Registro Fotográfico.....	8
8.	Conclusão.....	10

## 1. Apresentação do Relatório

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de Implantação da **Reformulação do Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação) do km 019+360, no município de Três Cachoeiras da rodovia BR-101/RS**, concluída efetivamente em fevereiro/2024, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50500.363765/2019-11, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para o 5º ano de concessão (31/10/2024).

**PER:** Item 3.2.1.2.

**Prazo de Conclusão:** 5º ano de concessão (31/10/2024).

**Descrição da Obra:** Reformulação do Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação).

**Localização:** Km 019+360 da BR-101/RS, município de Três Cachoeiras/RS.

## 2. Informações da Concessão


 <b>DADOS CONTRATUAIS</b>	
<b>Concessionária</b>	CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – “CCR ViaSul”
<b>Contrato</b>	Edital nº 01/2018
<b>Escopo do Contrato</b>	Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
<b>Assinatura do Contrato</b>	11/01/2019
<b>Início da Concessão</b>	15/02/2019
<b>Rodovia</b>	BR-101/116/386/448
<b>Trecho</b>	Rio Grande do Sul
<b>Extensão (km)</b>	473,4 km
<b>Prazo</b>	30 anos

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão

## 3. Mapa do Sistema Rodoviário

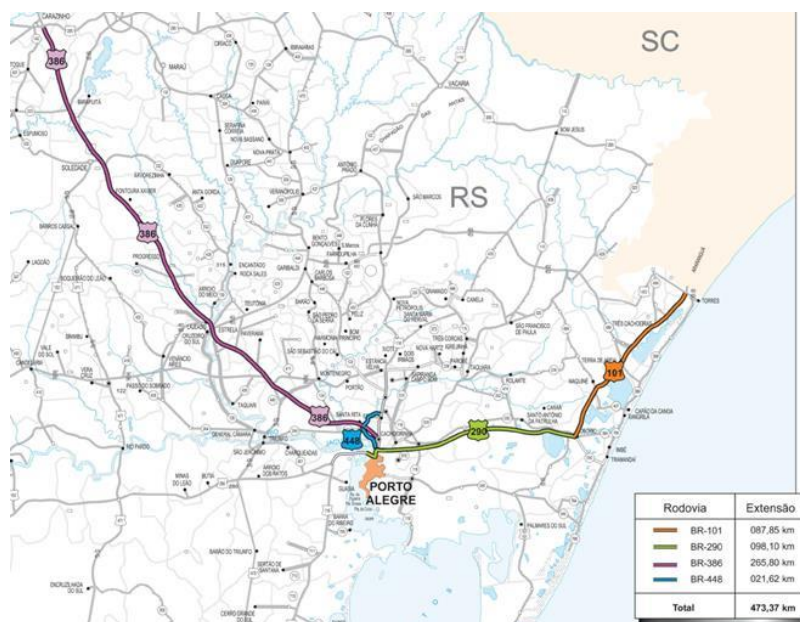


Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão

#### 4. Informações PER e Localização da Obra

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.2.1.2P	BR-101	RS	019,360	29°25'39.67"S	51°52'59.46"O	NS	2024	2024

Figura 3 – Informações PER



Figura 4 – Localização da obra

#### 5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Projeto Executivo Apresentado			Encerramento de obra		
	Parecer	SEI	Data	Parecer	SEI	Data
50500.363765/2019-11	722/2024/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	21300414	10/01/2024	8678/2026/RS/ESREGRO D-POA/SUL/COROD/GEFO P/SUROD/DIR-ANTT	40362815	13/03/2026

Figura 5 – principais documentos do processo

## 6. Memorial Descritivo

A Reformulação do Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação) constitui dos elementos descritos abaixo:

- Remoção da Camada Vegetal;
- Corte/Aterro;
- Camadas Finais de Terraplenagem;
- Sub-base;
- Base;
- Revestimentos;
- OAE;
- Sinalização Vertical;
- Sinalização Horizontal;
- Dispositivos de Segurança;
- Paisagismo;
- Limpeza de Canteiro.

## 7. Registro Fotográfico



**Vista geral da Reformulação BR 101/RS-km 019+360.**



**Vista geral da Reformulação BR 101/RS-km 019+360.**



**Vista geral da Reformulação BR 101/RS-km 019+360.**

## **8. Conclusão**

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.2.1.2 Obras de melhorias”, alínea “Recuperação OAE (BR-101/RS)”, km 019+360, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civas, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão N° 001/2018.
