	Cód. ANTT: VSL-101RS-009+670-RET-EXE-RT-V4-001-R00

Emitente: CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO – VIASUL	Data de Emissão Inicial: 18/05/2026
--	---

Rodovia: RODOVIA BR-101/RS	Projetista:
--------------------------------------	-------------

Trecho: BR-101– km 009+670 – RS-TORRES (PER 009+570)
--

Objeto: Relatório de Entrega de Obra – Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação) BR-101 km 009+670

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observações:

R0A	As Built	25/04/2025	Emissão Inicial			
Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP	ANTT

RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

Implantação da Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação)

BR-101 km 009+670 (PER 009+570)

Município de TORRES, BR-101/RS

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário
- **Rodovia:** BR-101/RS
- **Trecho:** km 009+670

Porto Alegre/RS

Maio de 2026

Sumário

1.	Apresentação do Relatório.....	4
2.	Informações da Concessão.....	5
3.	Mapa do Sistema Rodoviário.....	5
4.	Informações PER e Localização da Obra.....	6
5.	Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra.....	6
6.	Memorial Descritivo.....	7
7.	Registro Fotográfico.....	8
8.	Conclusão.....	10

1. Apresentação do Relatório

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de Implantação da **Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação) do km 009+570(PER), no município de Torres da rodovia BR-101/RS**, concluída efetivamente em fevereiro/2024, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50500.363998/2019-14, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para o 5º ano de concessão.

PER: Item 3.2.1.2.

Prazo de Conclusão: 5º ano de concessão.

Descrição da Obra: Reformulação do retorno existente.

Localização: Km 009+570 da BR-101/RS, município de Torres/RS.

2. Informações da Concessão


 DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – “CCR ViaSul”
Contrato	Edital nº 01/2018
Escopo do Contrato	Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do Contrato	11/01/2019
Início da Concessão	15/02/2019
Rodovia	BR-101/116/101/448
Trecho	Rio Grande do Sul
Extensão (km)	473,4 km
Prazo	30 anos

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão

3. Mapa do Sistema Rodoviário

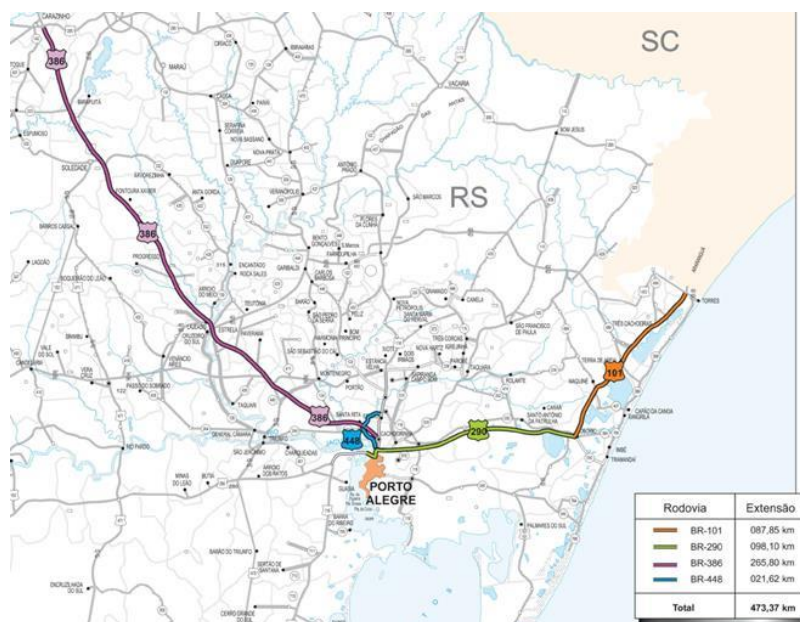


Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão

4. Informações PER e Localização da Obra

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.2.1.2	BR-101	RS	009,570	29°22'13.16"S	49°49'10.45"O	PNS	2024	2024

Figura 3 – Informações PER



Figura 4 – Localização da obra

5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Projeto Executivo Apresentado			Encerramento de obra		
	Parecer	SEI	Data	Parecer	SEI	Data
50500.363998/2019-14	36804/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR-ANTT	20141793	13/11/2023	8646/2026/RS/ESREG ROD-POA/SUL/COROD/GE FOP/SUROD/DIR-ANTT	40359931	13/03/2026

Figura 5 – principais documentos do processo

6. Memorial Descritivo

A Retorno em Nível (un) (inclusive iluminação) constitui dos elementos descritos abaixo:

- Remoção da Camada Vegetal;
- Corte/Aterro;
- Camadas Finais de Terraplenagem;
- Sub-base;
- Base;
- Revestimentos;
- Sinalização Vertical;
- Sinalização Horizontal;
- Dispositivos de Segurança;
- Paisagismo;
- Limpeza de Canteiro.

7. Registro Fotográfico



BR 101/RS km 009+570.



BR 101/RS km 009+570.



BR 101/RS km 009+570

8. Conclusão

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.2.1.2 Obras de melhorias”, alínea “Retorno em nível (BR-101)” reformulação do retorno existente, km 009+570, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civis, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão Nº 001/2018.
