	Cód. ANTT: VSL-290RS-074+700-PIN-EXE-RT-V1-001-R00					
Emitente: CONCESSINÁRIA DO SISTEMA RODOVIÁRIO – VIASUL	Data de Emissão Inicial: 18/05/2025					
Rodovia: RODOVIA BR-290/RS	Projetista:					
Trecho: BR-290–km 74+700 (PER) – RS-GRAVATAÍ						
Objeto: Relatório de Entrega de Obra – Alargamento e recuperação de OAE- BR-290 km 74+700 (PER)Leste/Oeste						
Documentos de Referência:						
Documentos Resultantes:						
Observações:						
R0A	As Built	25/04/2025	Emissão Inicial			
Revisão	Versão	Data	Descrição	Projetista	CCR RioSP	ANTT

RELATÓRIO DE ENTREGA DE OBRA

Implantação do Alargamento e recuperação de OAE- Leste/Oeste

BR-290 km 74+700

Município de Gravataí, BR-290/RS

- **Concessionária:** Concessionária do Sistema Rodoviário
- **Rodovia:** BR-290
- **Trecho:** km 74+700 (PER) Leste/Oeste

Porto Alegre/RS

Maio de 2026

Sumário

1.	Apresentação do Relatório.....	4
2.	Informações da Concessão.....	5
3.	Mapa do Sistema Rodoviário.....	5
4.	Informações PER e Localização da Obra.....	6
5.	Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra.....	6
6.	Memorial Descritivo.....	7
7.	Registro Fotográfico.....	8
8.	Conclusão.....	11

1. Apresentação do Relatório

Com base Resolução nº 6.000, de 01/07/2023, este relatório tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva, os serviços realizados decorrentes da obra de Implantação da **Alargamento e recuperação de OAE- Leste/Oeste do km 74+700, no município de Gravataí da rodovia BR-290/RS**, concluída efetivamente em fevereiro/2024, bem como os principais documentos inerentes a sua aprovação - processo SEI nº 50500.042044/2023-49, em cumprimento com as obrigações previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER para fevereiro de 2025.

PER: Item 3.2.1.2.

Prazo de Conclusão: fevereiro de 2025.

Descrição da Obra: Alargamento e recuperação de OAE.

Localização: Km 74+700 da BR-290/RS, município de Gravataí/RS.

2. Informações da Concessão


 DADOS CONTRATUAIS	
Concessionária	CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. – “CCR ViaSul”
Contrato	Edital nº 01/2018
Escopo do Contrato	Exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do Contrato	11/01/2019
Início da Concessão	15/02/2019
Rodovia	BR-101/116/386/448
Trecho	Rio Grande do Sul
Extensão (km)	473,4 km
Prazo	30 anos

Figura 1 – Informações do Contrato de Concessão

3. Mapa do Sistema Rodoviário

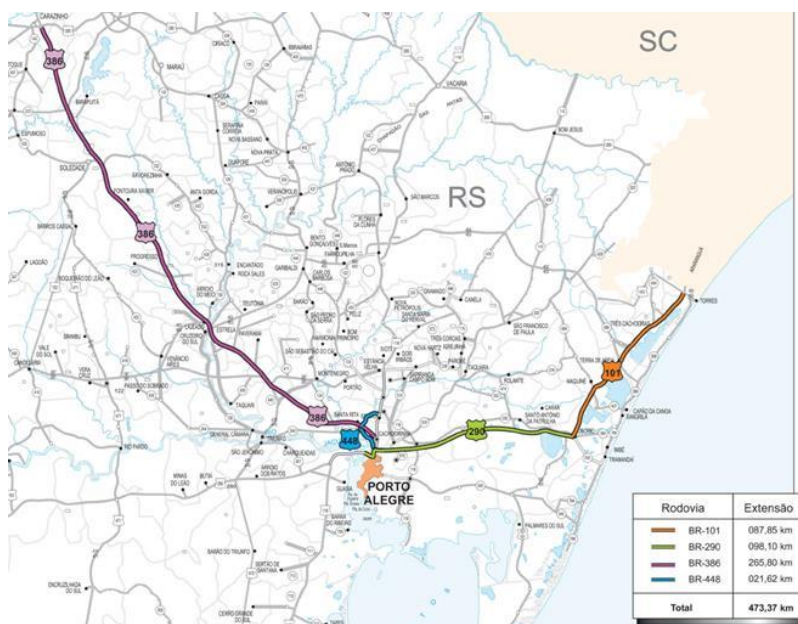


Figura 2 – Mapa do Sistema Rodoviário da Concessão

4. Informações PER e Localização da Obra

Item PER	Rodovia	UF	km	Latitude	Longitude	Sentido	Ano Conclusão	Ano Conclusão
			Inicial	Inicial	Inicial		Previsto	Realizado
3.2.1.2	BR-290	RS	74,700	29°30'33.45"S	51°56'30.90"O	LO	2024	2024

Figura 3 – Informações PER



Figura 4 – Localização da obra

5. Principais Peças do(s) Processo(s) Administrativo(s) Relativos à Obra

Processo	Projeto Executivo Apresentado			Encerramento de obra		
	Parecer	SEI	Data	Parecer	SEI	Data
50500.042044/2023-49	5978/2024/CPROJ/G EENG/SUOD/DIR- ANTT	21917899	23/02/2024	8638/2026/RS/ESREGR OD- POA/SUL/COROD/GEF OP/SUOD/DIR-ANTT	40359480	13/03/2026

Figura 5 – principais documentos do processo

6. Memorial Descritivo

A Alargamento e recuperação de OAE- Leste/Oeste constitui dos elementos descritos abaixo:

- Remoção da Camada Vegetal;
- Corte/Aterro;
- Camadas Finais de Terraplenagem;
- Sub-base;
- Base;
- Revestimentos;
- OAE;
- Sinalização Vertical;
- Sinalização Horizontal;
- Dispositivos de Segurança;
- Paisagismo;
- Limpeza de Canteiro.

7. Registro Fotográfico



Vista superior BR 290/RS- km 74+700



Vista Geral BR 290/RS- km 74+700.



Vista superior da passagem BR 290/RS-km 74+700.



Vista inferior BR 290/RS-km 74+700.



Vista frontal BR 290/RS-km 74+700.

8. Conclusão

Com base nas informações presentes nesse relatório, constituído por fotos e informações inerentes a obra, comprova-se o atendimento ao “Item 3.2.1.2 Obras de melhorias”, alínea “Alargamento e recuperação de OAE(BR-290)” Leste / Oeste, km 74+700, implantada por esta Concessionária, relativo às Obras Civis, em especial quanto à compatibilidade com os Projetos de Engenharia e demais documentos aprovados pelo Poder Concedente, em atendimento ao Contrato de Concessão Nº 001/2018.
